

PROTOKOLL: **PK_04-2026 Betra Antrag Besprechung Spp 07.04.- 16.04.26 Str. 4700 TSC-TSU**

Betrifft:	Stuttgart 21 DKS ZE TSUX
Vergabe Nr.:	
Ort:	MS Teams
Datum / Zeit:	12.02.2026 10:00 – 11:00 Uhr
Ersteller:	BÜW DB E&C
Anwesend: Ohne Titel	AG: Hr. Bojnourdi, Hr. Seelaender, Hr. Khattabi, Hr. Vujic, Fr. Cebula, BOL: Hr. Hofstetter, Hr. Schnepf DB InfraGo: Fr. Mendes, Hr. Kleeh, Hr. Glassl, BÜ: Hr. Abu Zaid, Hr. Boujaj, Hr. Höttsch, Hr. Bennani, Hr. Roth, Hr. Schreiber LW. TSU: Hr. Berthold LW. TSC: Hitachi: Hr. Schmidt, Hr. Senyuezlue, Spitzke: Hr. Spitzke, Hr. Wagner, Hr. Mewes RPS: Hr. Kapp, Eiffage: Sicherung: Hr. Grabowski, Sigeko: Vermessung:
Anlagen:	Skizze Sperrbereich


Verteiler: Teilnehmer	Übermittlung mit der Bitte um weitere interne Verteilung	E-Mail
AG	Norbert.Scherer@deutschebahn.com; andre.reinhardt@deutschebahn.com Martin.Maguolo@deutschebahn.com; Patrick.Cwielong@deutschebahn.com	<input checked="" type="checkbox"/>
BBK /ALV	uwe.uw.friedrich@deutschebahn.com; sebastian.biber@deutschebahn.com; alexander.schenk@deutschebahn.com; thomas.seeger@deutschebahn.com; uwe.u.schaefer@deutschebahn.com;	<input checked="" type="checkbox"/>
AN L. Weiss TSU	m.fritz@leonhard-weiss.com; a.mirazchiyski@leonhard-weiss.com; LW-36310137@leonhard-weiss.com;	<input checked="" type="checkbox"/>
AN L. Weiss TSC	LW-90016690@leonhard-weiss.com; m.jessberger@leonhard-weiss.com; j.hegele@leonhard-weiss.com; s.waibel@leonhard-weiss.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Hitachi	martin.buettner@urbanandmainlines.com; stefan.wallberg@urbanandmainlines.com; markus.kelzenberg@urbanandmainlines.com; cedric.schmidt@urbanandmainlines.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Spitzke	juergen.Hiensch@spitzke.com; Fabian.Spitzke@spitzke.com; Johannes.Dapfer@spitzke.com; Jan.Doelves@spitzke.com; Holger.Petrich@spitzke.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN RPS	Andreas.Kapp@rail-ps.com; sascha.arnold@rail-ps.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Eiffage	karsten.metz@eiffage.de; ekrem.sentuerk@eiffage.de	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Siemens	karsten.porwol@siemens.com; silvio.hering@siemens.com	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherung	untertuerkheim@eisenmann-services.de; backnang@eisenmann-services.de	<input checked="" type="checkbox"/>
UBÜ	Christian.C.Runge@deutschebahn.com; Alexander.AI.Schramm@db-eco.com	<input checked="" type="checkbox"/>
SiGeKo	Sigeko.s21@mplus-management.de; pbr@mplus-management.de; kno@mplus-manage- ment.de	<input checked="" type="checkbox"/>
BÜ (DB E&C + eba consult)	buew.uthoth.dbec@deutschebahn.com; robert.gyarmati@bg-rail.de	<input checked="" type="checkbox"/>

Original bleibt beim Ersteller

1. Titel der Maßnahme: DKS Spp 07.04.- 16.04.26 Str. 4700 TSC-TSU

2. Abgleich BBP

Sperrung laut Auszug Daumenkino Stand 23.12.2025:

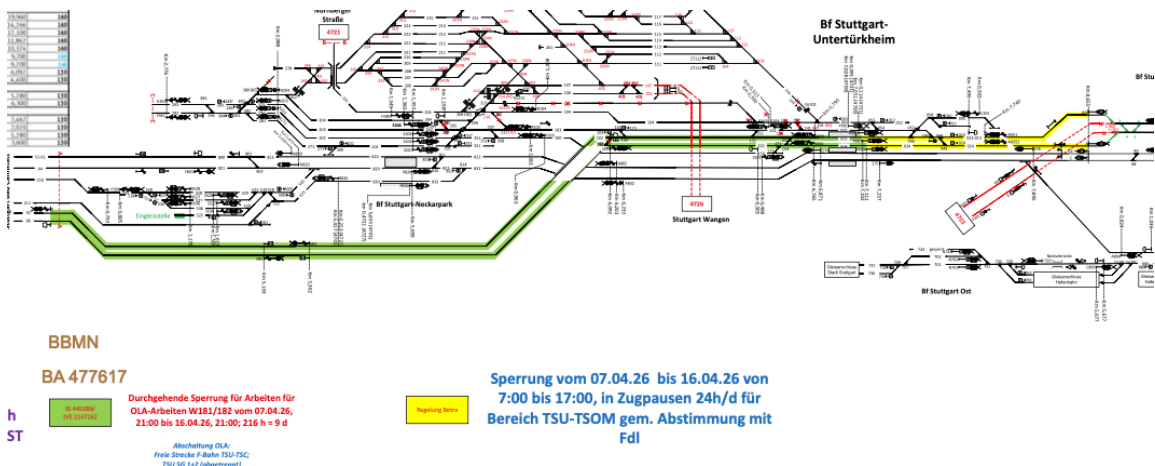

Erforderliche Änderungen gegenüber dem BBP:

Bemerkungen:

-

2.2 Planungsunterlagen

Grundlage:

Freigegebenen Planunterlagen sind für die Arbeiten notwendig und rechtzeitig in den Prüflauf zu geben. Die Arbeiten dürfen nur mit freigegebener Planung begonnen werden.

Für die Maßnahmen gültige Planpakete:

- **LST**
- ..
- **OLA**
- ..
- **Fb/KIB**
- ..

Naturschutz:

Zu Beginn der Arbeiten muss die Freigabe der Naturschutzbehörde vorliegen und eine Einweisung der UBÜ muss erfolgt sein!

- Globalantrag für Arbeiten zum DKS ist gültig.

2.3 Vorstellung Bauablauf

L. Weiss TSU:

- KTB auf 4700 mit 2 ZWB+KLA in 2 Schichtbetrieb
- Kabelzug zu allen Weichen (WHZ) gesamter Bahnhofskopf ab W 156 in Zp
- Logistik aus Mertzgleis

Spitzke:

- OLA (Maste, Kettenwerke) Arbeiten entfallen wegen fehlender Vorleistungen
- 50Hz Leistungen Weichenheizstäbe tauschen (ohne Fahrzeuge)
- Alle Weichen im Sperrbereich + W 172

	<p><u>Hitachi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ls Montage + Vermessung - Montage GSM - Pfosten setzen betonieren - Kabelarbeiten - Keine Fahrzeuge im Einsatz <p><u>Eiffage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückmeldung folgt durch Hr. Metz <p><u>RPS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Leistungen geplant <p><u>Weitere Firmen:</u></p> <p>Aktuell keine weiteren Einsätze geplant. Rz (W181/182) wird nicht geöffnet.</p> <p>Fa. Seer (Forstbetrieb) mit aufnehmen</p>	
<p>2.4</p>	<p>Konflikte / offene Punkte</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gl. 211 + 598 mit Sh 2 sperren (BzS) - Arbeiten von LW enden im Km 6,0 Absperrung der Bahnsteige Gleis 3 + 4 in TSU ist zu klären (evtl. Sperrbereich kürzen), BGL nur auf freier Strecke TSC-TSU beantragt im Bhf TSU nur gesperrte Gleise 	<p>V:Kohberg</p>
<p>2.5</p>	<p>Sonstiges</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Abschaltung von Speiseleitungen erforderlich?: nein - Fahrzeugeinsatz: mehrere ZWB mit KLA - Gleisfahrbare Geräte die eingesetzt werden (temp. Baugleis): nicht im Einsatz - Eingleisstellen: Mertzgleis und Baufeld und geeignete Stelle im BGL - Bahnsteig sperren: vom jeweiligen AN der dort tätig ist - Anwohnerinfo erforderlich: über David Fischer in Abstimmung mit LW - Flankenschutz: nicht erforderlich - Sh2 Scheiben Anzahl: mind. 8 Stück +2 Reserve - Bahnerdung: erfolgt durch: Fa. Eisenmann Services – Festlegung der Erdungspunkte durch BüW mit Einweisung der Bahnerder – - EI 6 Signale: ja - SAS ist techn. Berechtigte + Fa. Eisenmann 	
<p>2.6</p>	<p>Sicherung</p>	
	<p>Seiten 1 müssen rechtzeitig über Sipla workflow eingereicht werden, Festlegung der Sicherungsmaßnahmen erfolgen über den Sicherungsplan.</p> <p>Vorschlag Sicherungsart: NGL (Gl. 103- 002) mit UV Sperrungen arbeiten</p> <p>Benachrichtigung Anwohner Lärm Baustelle / ATWS? – siehe oben D. Fischer</p> <p>Sipla Seiten 1 müssen bis 05.03.2026 eingereicht werden.</p> <p>BA Nr.: 477617</p> <p>Weitere notwendige Angaben:</p> <p>AIM Netz: Stuttgart(16TB)</p> <p>Projektnummer: G.016000960</p> <p>Projektname: Projekte von DB Projekt Stuttgart-Ulm (Stuttgart 21 mit NBS Wendlingen - Ulm) unter 1.7 Betra Antrag Nr. eintragen. unter 1.9 Nachunternehmer angeben.</p>	<p>V: alle AN</p>


BAUÜBERWACHUNG

PROTOKOLL: **PK_04-2026 Betra Antrag Besprechung Spp 07.04.- 16.04.26 Str.
4700 TSC-TSU**

Sicherungsunternehmen: Eisenmann Services GmbH, Illerstraße 10a, 71522 Backnang

Sicherungsüberwachung: DB E& C GmbH - Bauüberwachungszentrale Projekt Stuttgart - Ulm (FD.TV-SW-
Ü-U) Räßlenstr. 19 70191 Stuttgart

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 458569
vom 28.02.26. 00:30 Uhr bis 07.03.26 14:00 Uhr durchgehend

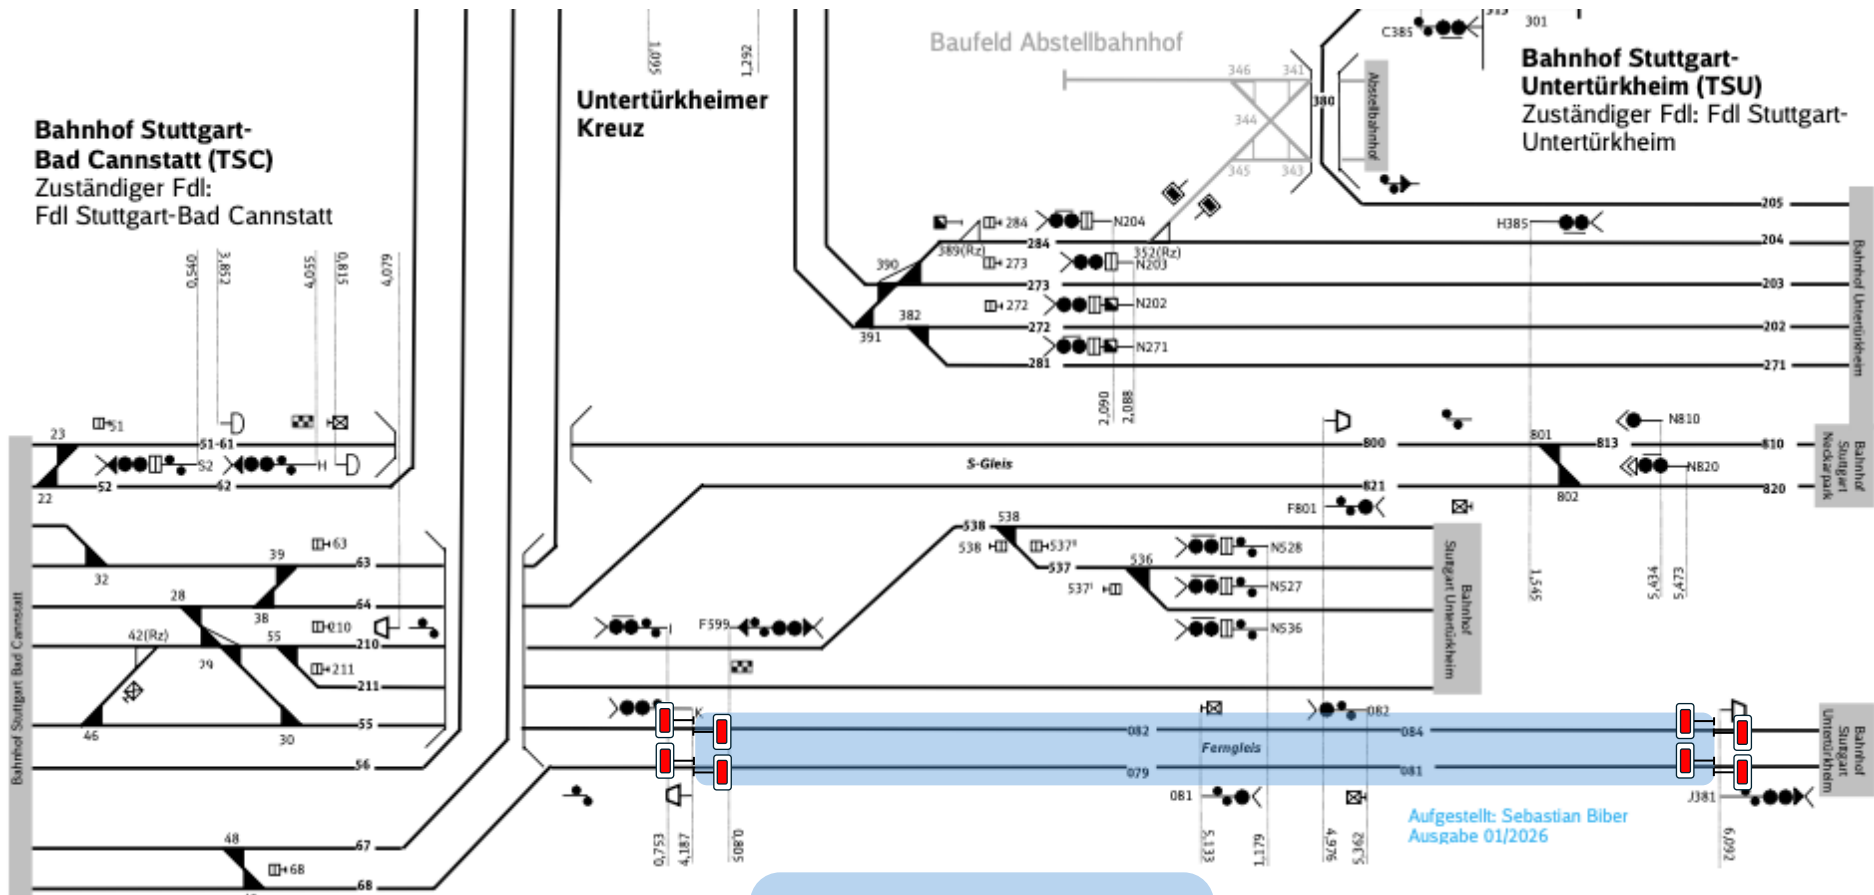

Sperrung zu Abschnitt
2.2.1 - 2.2.2
07.04. 21:00 bis 16.04.26 21:00Uhr
BGL – F-Gleis

Aufgestellt: Sebastian Biber
Ausgabe 01/2026

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 458569
vom 28.02.26. 00:30 Uhr bis 07.03.26 14:00 Uhr durchgehend

Stellwerk „Uf“
Sp Dr S 60

7. Bahnhof
Stuttgart-
Untertürkheim
Bahnhof
Stuttgart-
Neckarpark


Sperrung zu Abschnitt
2.2.5 - 2.2.10
In Zugpausen
07.04. 21:00 bis 16.04.26 21:00Uhr

Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim (TSU)
Zuständiger Fdl: Fdl Stuttgart-Untertürkheim

Bahnhof Stuttgart-Neckarpark (TSNS)
Zuständiger Fdl:
Fdl Stuttgart-Untertürkheim

Sperrung zu Abschnitt
2.2.1 - 2.2.2
07.04. 21:00 bis 16.04.26 21:00Uhr
BGL – F-Gleis

Aufgestellt: Sebastian Biber
Ausgabe 01/2026

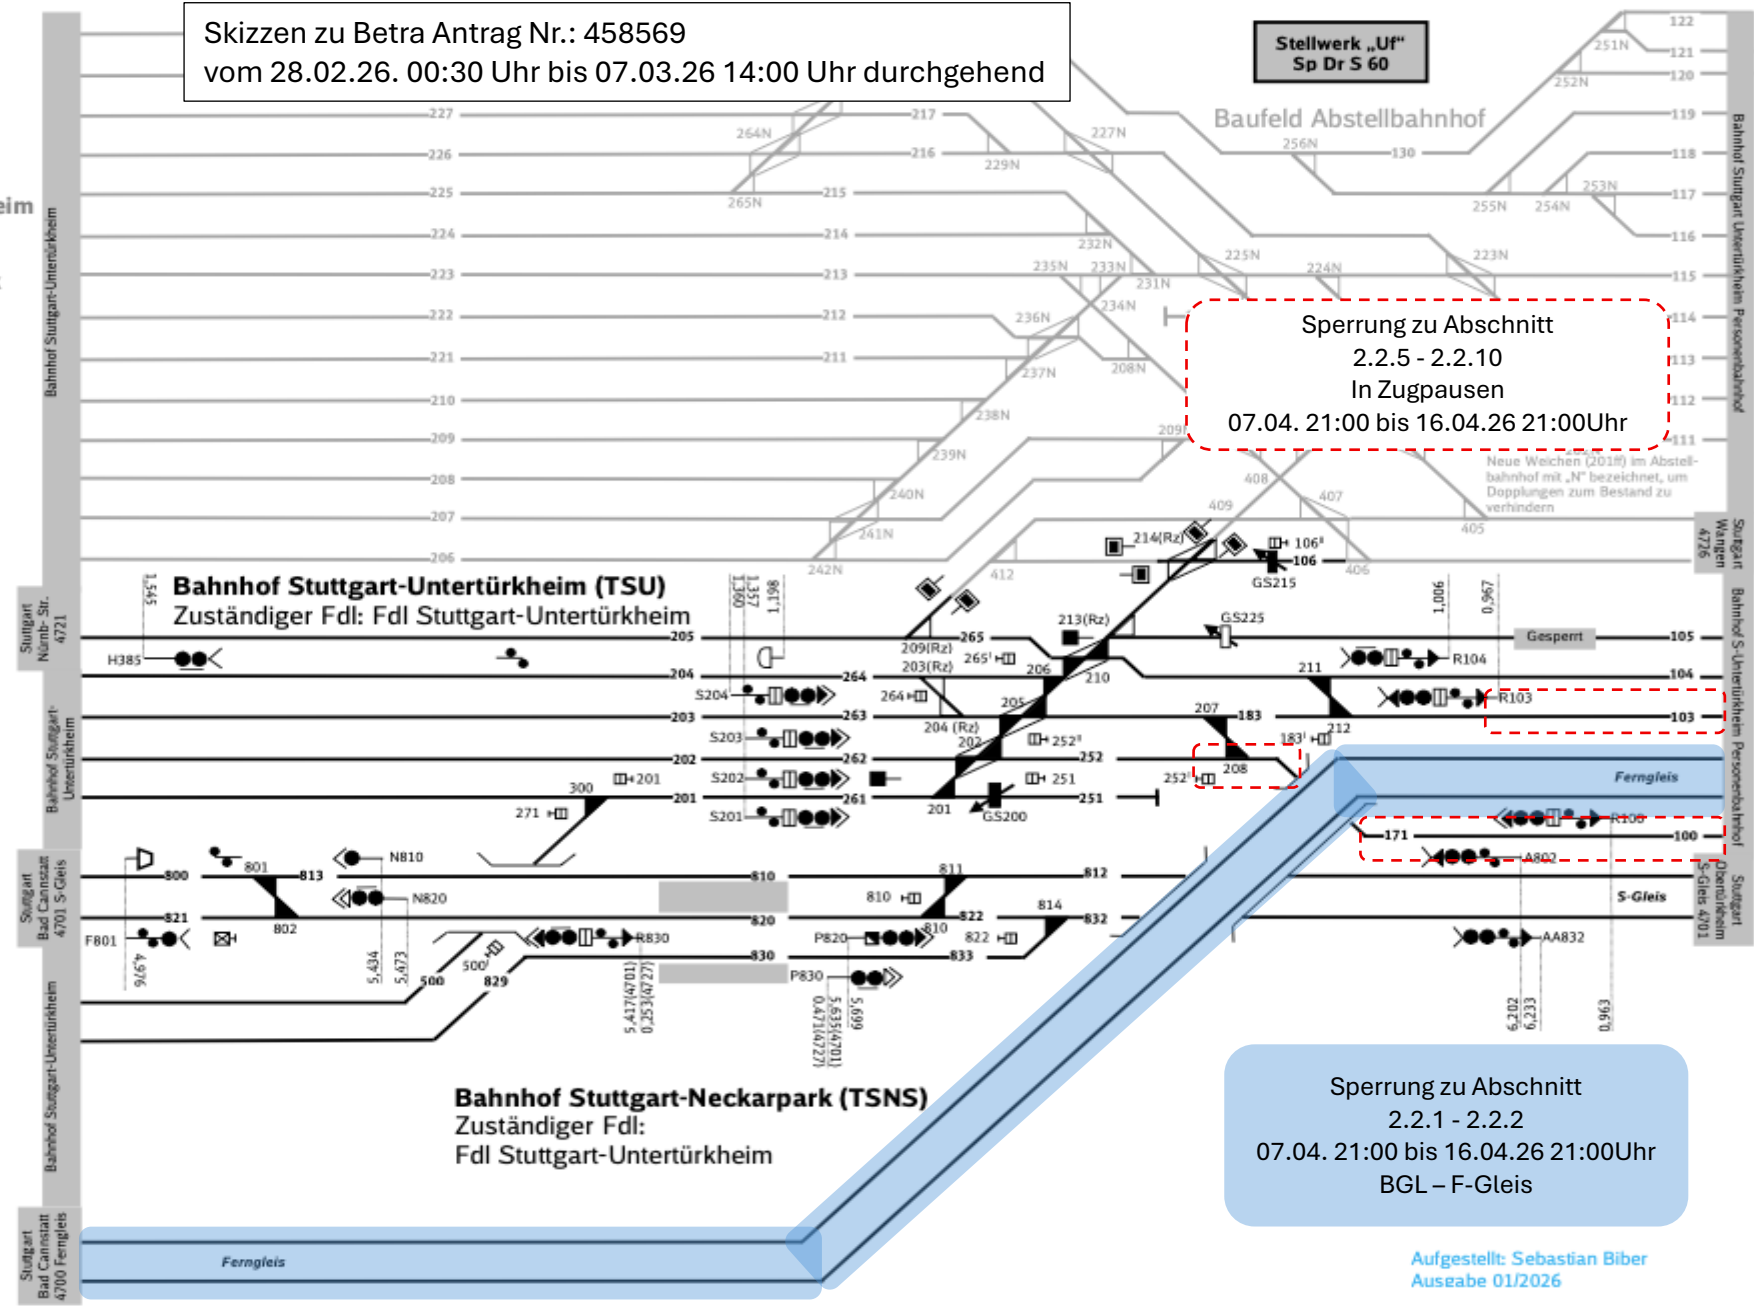

Sperrung zu Abschnitt
2.2.1 - 2.2.2
07.04. 21:00 bis 16.04.26 21:00Uhr
BGL – F-Gleis

Skizzen zu Beta Antrag Nr.: 458569
vom 28.02.26. 00:30 Uhr bis 07.03.26 14:00 Uhr durchgehend

8. Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim Bft Personenbahnhof

Sperrung zu Abschnitt
2.2.3 - 2.2.4
07.04. 21:00 bis 16.04.26 21:00Uhr

Sperrung zu Abschnitt
2.2.5 - 2.2.10
In Zugpausen
07.04. 21:00 bis 16.04.26 21:00Uhr

