

PROTOKOLL: **PK_10-2026 Betra Antrag Besprechung Spp 20.04.-22.06.26 Daumenkino Blatt 9 - 11**

Betrifft:	Stuttgart 21 DKS ZE TSUX
Vergabe Nr.:	
Ort:	MS Teams
Datum / Zeit:	13.03.2026 09:00 – 10:00 Uhr
Ersteller:	BÜW DB E&C
Anwesend: Ohne Titel	AG: Hr. Maguolo, Hr. Khattabi, Hr. Vujic, Fr. Cebula, BOL: Hr. Hofstetter, Hr. Schnepf, Hr. Regel, Hr. Fischer DB InfraGo: Hr. Klee, H, BÜ: Hr. Abu Zaid, Hr. Boujaj, Hr. Höttsch, Hr. Bennani, Hr. Tahiri, Hr. Karaduman, Hr. Baselt LW. TSU: Hr. Berthold (kurzzeitig) LW. TSC: Hitachi: Hr. Senyuezlue, Hr. Berger Spitzke: Hr. Spitzke, Hr. Esche, Hr. Abdeljelil RPS: Hr. Straube, Eiffage: Sicherung: Hr. Atilgan, Sigeko: Logistik: Hr. Mewes
Anlagen:	Blatt 9 – 11 Daumenkino und Skizzen für Blatt 9 + 10

Verteiler: Teilnehmer	Übermittlung mit der Bitte um weitere interne Verteilung	E-Mail
AG	Norbert.Scherer@deutschebahn.com; andre.reinhardt@deutschebahn.com Martin.Maguolo@deutschebahn.com; Patrick.Cwielong@deutschebahn.com	<input checked="" type="checkbox"/>
BBK /ALV	uwe.uw.friedrich@deutschebahn.com; sebastian.biber@deutschebahn.com; alexander.schenk@deutschebahn.com; thomas.seeger@deutschebahn.com; uwe.u.schaefer@deutschebahn.com;	<input checked="" type="checkbox"/>
AN L. Weiss TSU	m.fritz@leonhard-weiss.com; a.mirazchyski@leonhard-weiss.com; LW-36310137@leonhard-weiss.com;	<input checked="" type="checkbox"/>
AN L. Weiss TSC	LW-90016690@leonhard-weiss.com; m.jessberger@leonhard-weiss.com; j.hegele@leonhard-weiss.com; s.waibel@leonhard-weiss.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Hitachi	martin.buettner@urbanandmainlines.com; stefan.wallberg@urbanandmainlines.com; markus.kelzenberg@urbanandmainlines.com; cedric.schmidt@urbanandmainlines.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Spitzke	juergen.Hiensch@spitzke.com; Fabian.Spitzke@spitzke.com; Johannes.Dapfer@spitzke.com; Jan.Doelves@spitzke.com; Holger.Petrich@spitzke.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN RPS	Andreas.Kapp@rail-ps.com; sascha.arnold@rail-ps.com	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Eiffage	karsten.metz@eiffage.de; ekrem.sentuerk@eiffage.de	<input checked="" type="checkbox"/>
AN Siemens	karsten.porwol@siemens.com; silvio.hering@siemens.com	<input checked="" type="checkbox"/>
Sicherung	untertuerkheim@eisenmann-services.de; backnang@eisenmann-services.de	<input checked="" type="checkbox"/>
UBÜ	Christian.C.Runge@deutschebahn.com; Alexander.AI.Schramm@db-eco.com	<input checked="" type="checkbox"/>
SiGeKo	Sigeko.s21@mplus-management.de; pbr@mplus-management.de; kno@mplus-manage- ment.de	<input checked="" type="checkbox"/>
BÜ (DB E&C + eba consult)	buew.uthoth.dbec@deutschebahn.com; robert.gyarmati@bg-rail.de	<input checked="" type="checkbox"/>

Original bleibt beim Ersteller

1. Titel der Maßnahme: DKS Spp Spp 20.04.-22.06.26 Daumenkino Blatt 9 - 11

2. Abgleich BBP

Sperrung laut Auszug Daumenkino Stand 23.12.2025:

Siehe Anlagen.

Erforderliche Änderungen gegenüber dem BBP:

Bemerkungen:

-

2.2 Planungsunterlagen

Grundlage:

Freigegebenen Planunterlagen sind für die Arbeiten notwendig und rechtzeitig in den Prüflauf zu geben. Die Arbeiten dürfen nur mit freigegebener Planung begonnen werden.

Für die Maßnahmen gültige Planpakete:

- **LST**
- ..
- **OLA**
- ..
- **Fb/KIB**
- ..

Naturschutz:

Zu Beginn der Arbeiten muss die Freigabe der Naturschutzbehörde vorliegen und eine Einweisung der UBÜ muss erfolgt sein!

- Globalantrag für Arbeiten zum DKS ist gültig.

2.3 Vorstellung Bauablauf

L. Weiss TSU:

- **Blatt 10**
- Wir LW TSU nehmen nur an die SPP 05.05-11.05 (Gl. 1+2+3) teil
- Wir planen mit 2 ZWB zu arbeiten, aktuell haben wir 1 bestätigt
- Wir gleisen von der AGS ein
- Wir möchten bitte auch neben Signal C355 (Str. 4724 KM 0,502) arbeiten, also wir brauchen beide SG-Gruppen auch und eventuell, dass die SH2 Scheibe weiter Richtung Hafen aufgestellt wird)
- Die anderen Arbeiten, die wir ausführen (leider vertraglich nicht geklärt und Planung noch nicht vorhanden)
- Achtung wegen Gleis 003 Vmax größer 120km/h Angaben im Sipla

Spitzke:

- **Blatt 9**
- Arbeiten Geplant ist, dass wir in der schichtweisen Sperrpause vom 20.04-30.04.26 in den Bahnhofsgleisen 1 & 2 arbeiten an der Oberleitung durchführen. U.a. wollen wir die Maste stellen, Mehrgleisausleger, Ausleger und Schalter aufbauen und die vorhandene Oberleitungsanlage auf die neuen Maste übernehmen.
- Das neue im Oberleitungsplan dargestellte Kettenwerk in den Abstellbahnhof können wir leider nicht ziehen, da wir die Spannung sonst ins Baufeld ziehen würden.

PROTOKOLL: **PK_10-2026 Betra Antrag Besprechung Spp 20.04.-22.06.26 Daumen-
kino Blatt 9 - 11**

- **Einkürzen Sperrbereich bis Sig R 163, SG 38 bleibt ein, Arbeitsbereich (4720) von km 0,0 bis km 0,150**
- Arbeiten an der WHZ 16 + 17, Heizstäbe tauschen, Kabelarbeiten
- Die Sicherung der Baustelle erfolgt von Signal R003 bis R 163 mit ATWS
- **Ebsü Antrag wird am 18.03.26 vorgelegt.**

- **Blatt 10**
- Arbeiten an der WHZ 16 + 17, Heizstäbe tauschen, Kabelarbeiten
- Tausch der Hauptverteilung für WHZ – Einsatz ZWB zum Transport
- Am 10.05. muss SG 109 mit abgeschaltet werden

- **Blatt 11**
- Arbeiten an WHZ 16 / 17 Arbeiten an der Außenanlage (Kabel Heizstäbe, etc.)
- Arbeiten in Nachtschicht 15.06.- 22.06. 18:00 – 04:00 Uhr) werden eingeplant

V:
F.Spitz
ke

Hitachi:

- **Blatt 9**
- Arbeiten an GSM, Kabelarbeiten etc., keine Fahrzeuge im Einsatz
- **Blatt 10**
- Arbeiten an GSM, Kabelarbeiten etc., keine Fahrzeuge im Einsatz

Eiffage:

- Nicht Anwesend

RPS:

- **Blatt 10**
- Arbeiten in der 500er Gruppe – Ebsü Antrag liegt vor
- Keine Maschinen im Einsatz Sipla S1 wenn möglich über OBP einreichen Ansprechpartner (Johannes Bihlmaier / Sarah Nounou)

Weitere Firmen:

2.4 Konflikte / offene Punkte

-
-

2.5 Sonstiges

- Abschaltung von Speiseleitungen erforderlich?: nein
- Fahrzeugeinsatz: mehrere ZWB mit KLA, MTW, Schörling
- Gleisfahrbare Geräte die eingesetzt werden (temp. Baugleis): **ART temp. BGL erforderlich (W 053 / 054)**
- Eingleisstellen: Mertzgleis und Baufeld und geeignete Stelle im BGL
- Bahnsteig sperren: wird vom jeweiligen AN bei Bedarf ausgeführt
- Anwohnerinfo erforderlich: **für Sonntag 26.04.26 notwendig gesamten Zeitraum anmelden (20.04.-30.04. + 05.05.-11.05.26) – erfolgt über Hr. D. Fischer**
- Flankenschutz: nicht erforderlich
- Sh2 Scheiben Anzahl: mind Stück +2 Reserve
- Bahnerdung: erfolgt durch: Fa. Eisenmann Services + 05.05.-11.05.26 für LW (Fa. **Spitzke erdet sich selbst**)
- Festlegung der Erdungspunkte durch BüW mit Einweisung der Bahnerder
- EI 6 Signale: nein
- SAS ist techn. Berechtigte + Fa. Eisenmann

2.6 Sicherung

PROTOKOLL: **PK_10-2026 Betra Antrag Besprechung Spp 20.04.-22.06.26 Daumen-
kino Blatt 9 - 11**

Seiten 1 müssen rechtzeitig über Sipla workflow eingereicht werden, Festlegung der Sicherungsmaßnahmen erfolgen über den Sicherungsplan.

**V: alle
AN**

Vorschlag Sicherungsart:

Bei Arbeiten in TSU Gleis 003 (Blatt 10) Räumzeit zweites AGL zwingend erforderlich(Punkt 1.5.1)

Benachrichtigung Anwohner Lärm Baustelle / ATWS? – siehe oben D. Fischer

Sipla Seiten 1 müssen bis 18.03.2026 (Blatt 9) 30.03.2026 (Blatt 10) 08.04.2026 (Blatt 11) eingereicht werden.

BA Nr.:

Blatt 9: 486334

Blatt 10: 489398

Blatt 11: 492864 für TWN und für TSU – BA und Skizzen werden nachgereicht.

Weitere notwendige Angaben:

AIM Netz: Stuttgart(16TB)

Projektnummer: G.016000960

Projektname: Projekte von DB Projekt Stuttgart-Ulm (Stuttgart 21 mit NBS Wendlingen - Ulm)
unter 1.7 Betra Antrag Nr. eintragen.

unter 1.9 Nachunternehmer angeben.

Sicherungsunternehmen: Eisenmann Services GmbH, Illerstraße 10a, 71522 Backnang

Sicherungsüberwachung: DB E& C GmbH - Bauüberwachungszentrale Projekt Stuttgart - Ulm (FD.TV-SW-Ü-U) Räpplenstr. 19 70191 Stuttgart


**9. Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim
Bahnhof Stuttgart-Neckarpark**

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 486334
vom 20.04.26. 07:00 Uhr bis 30.04.26 17:00 Uhr täglich

zu Abschnitt 2.2.1 - 2.2.2
20.04.-30.04.26 jeweils
07:00 bis 17:00Uhr


Stellwerk „Uf“
Sp Dr S 60

Baufeld Abstellbahnhof

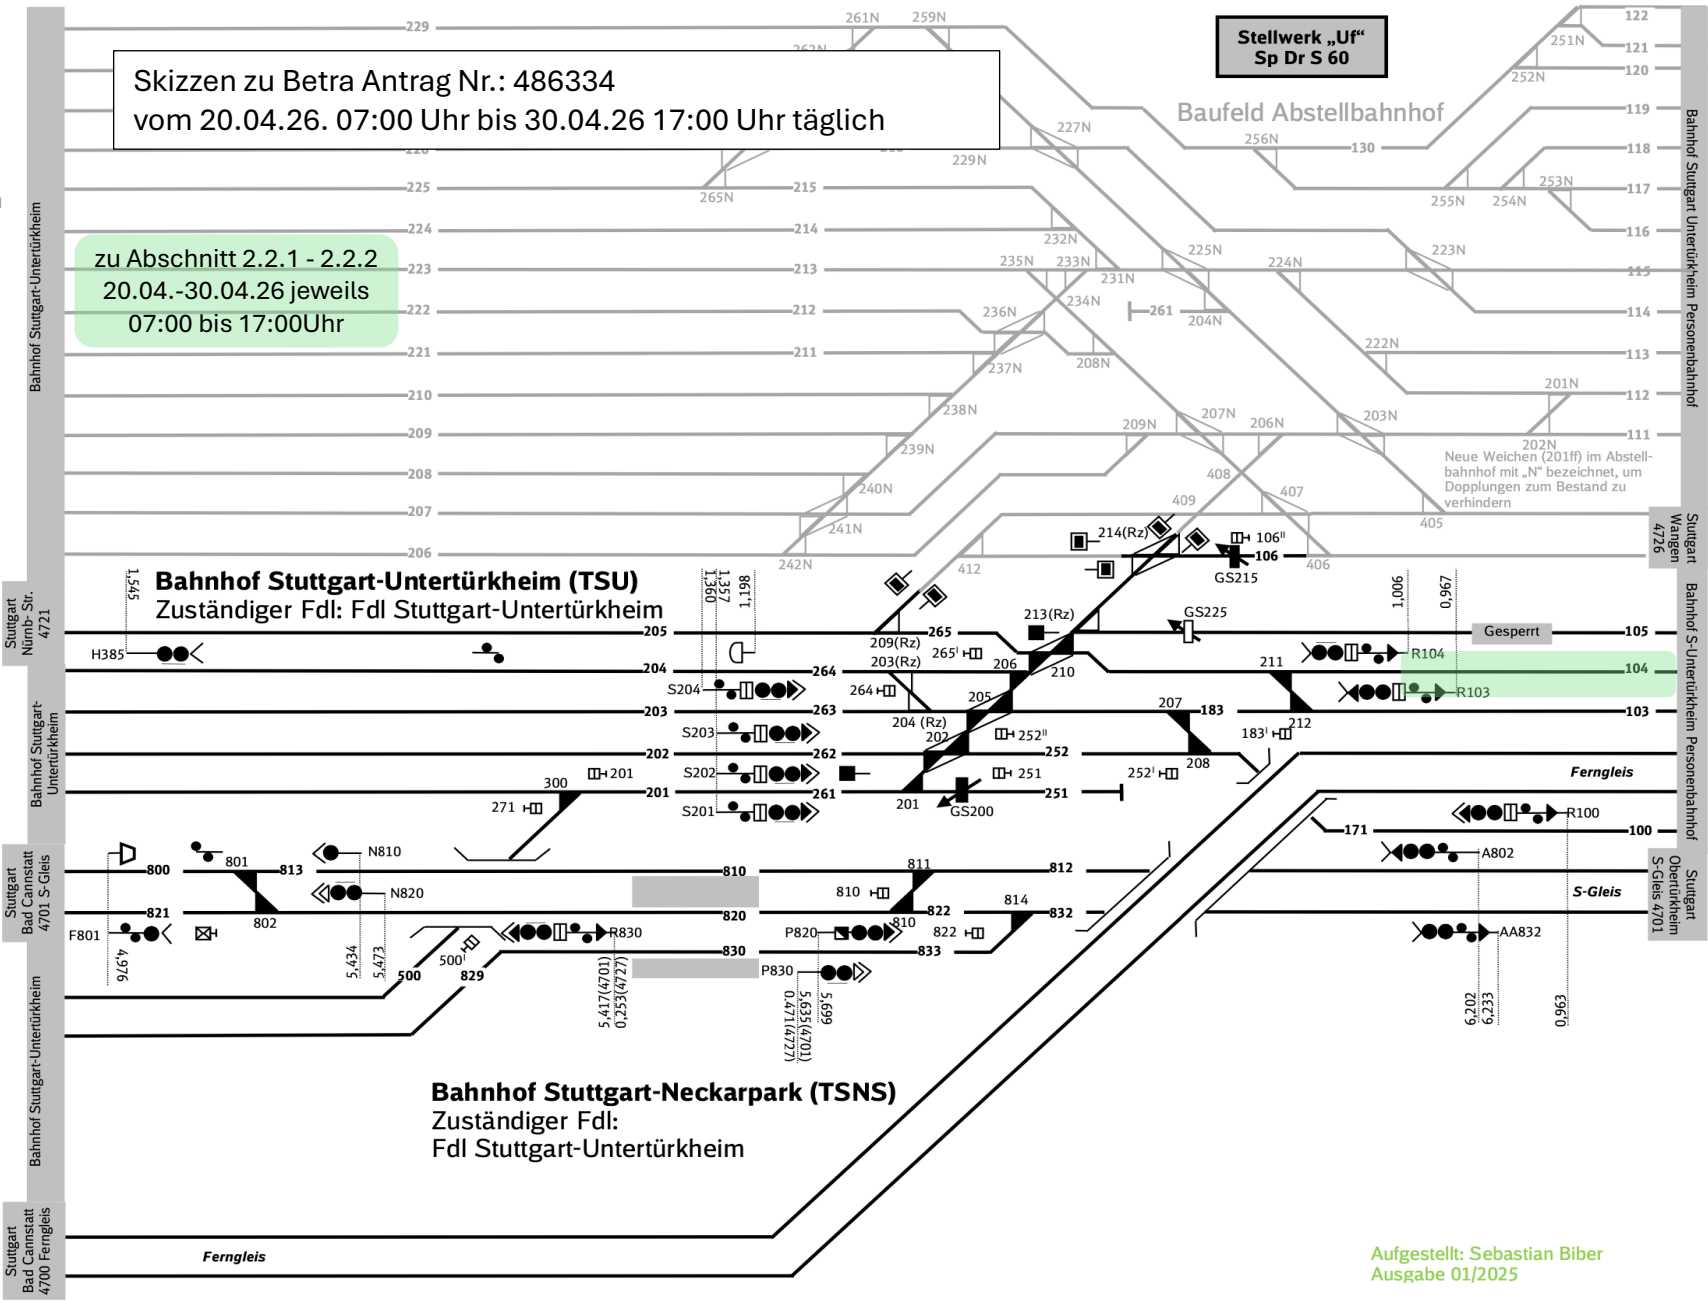

Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim (TSU)
 Zuständiger Fdl: Fdl Stuttgart-Untertürkheim

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 489398
 vom 05.05.26 bis 11.05.26 täglich 07:30 Uhr - 17:30 Uhr (7x10h)
 und 04.05.26 07:00 Uhr bis 12.05.26 17:00 Uhr (202h)

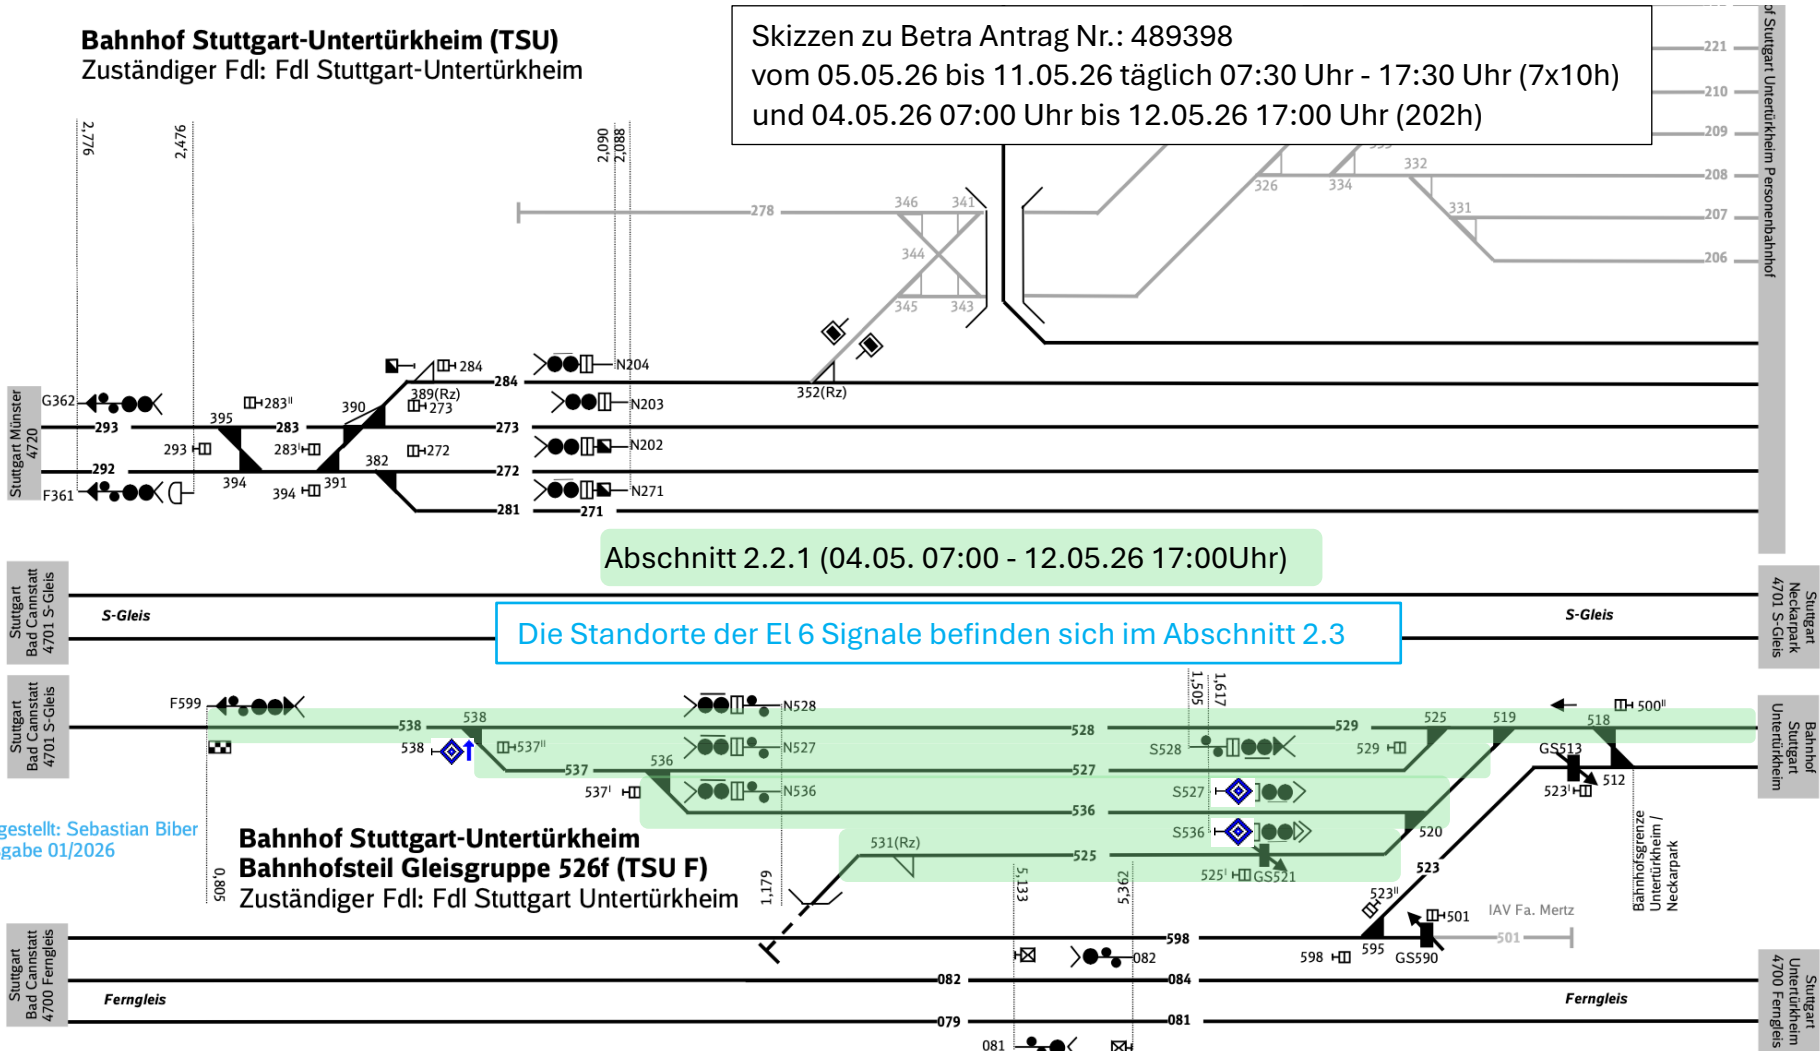

Abschnitt 2.2.1 (04.05. 07:00 - 12.05.26 17:00Uhr)

Die Standorte der El 6 Signale befinden sich im Abschnitt 2.3

Aufgestellt: Sebastian Biber
 Ausgabe 01/2026

Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim
Bahnhofsteil Gleisgruppe 526f (TSU F)
 Zuständiger Fdl: Fdl Stuttgart Untertürkheim

7. Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim
Bahnhof Stuttgart-Neckarpark

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 489398
 vom 05.05.26 bis 11.05.26 täglich 07:30 Uhr - 17:30 Uhr (7x10h)
 und 04.05.26 07:00 Uhr bis 12.05.26 17:00 Uhr (202h)


**Stellwerk „Uf“
 Sp Dr S 60**

Baufeld Abstellbahnhof

Abschnitt 2.2.2 – 2.2.4
 05.05. - 11.05.26 jeweils 07:30 Uhr - 17:30 Uhr

Abschnitt 2.2.1 (04.05. 07:00 - 12.05.26 17:00Uhr)


Die Standorte der El 6 Signale befinden sich im Abschnitt 2.3

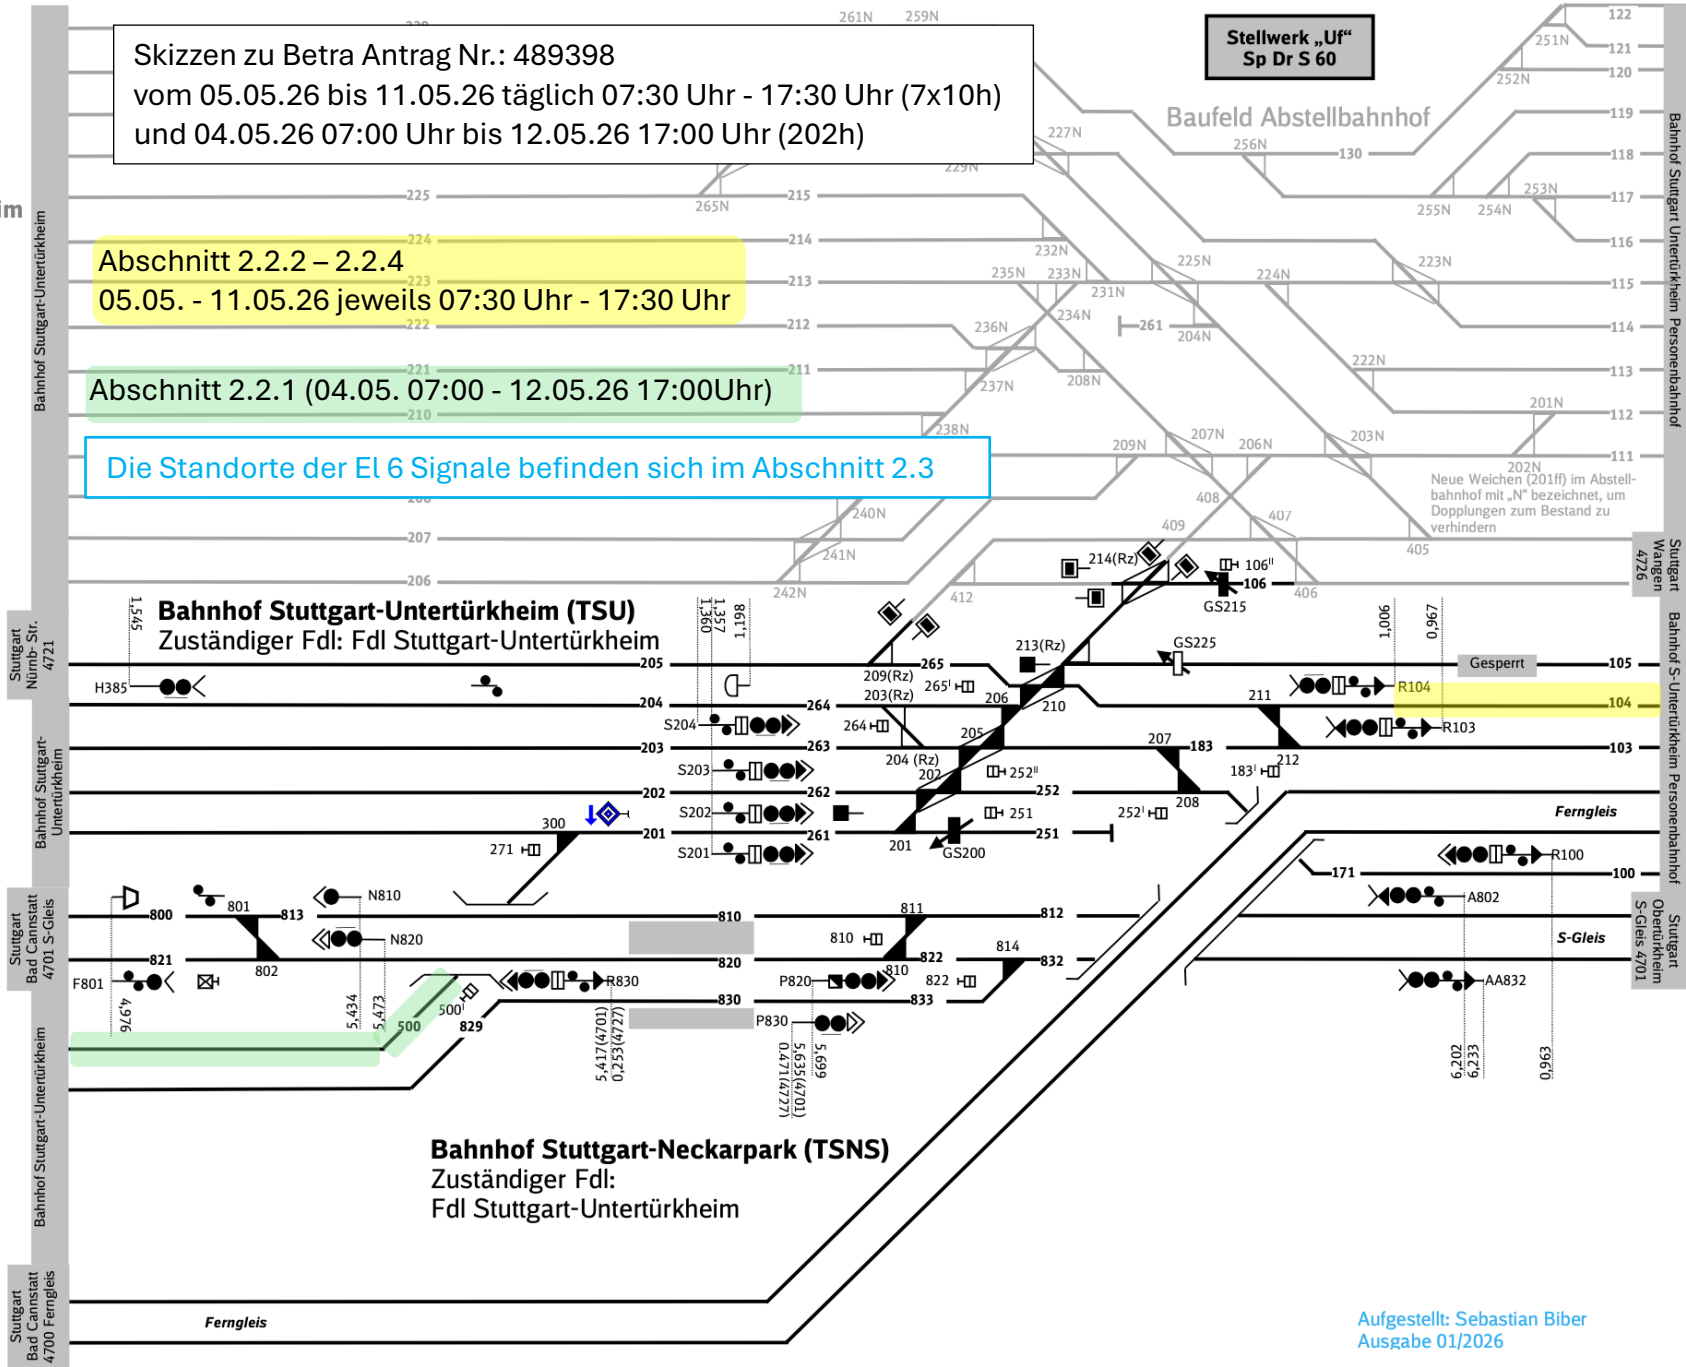

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 489398
 vom 05.05.26. bis 11.05.26 täglich 07:30 Uhr - 17:30 Uhr (7x10h)

8. Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim Bft Personenbahnhof

Abschnitt 2.2.2 – 2.2.4
 05.05. - 11.05.26 jeweils 07:30 Uhr - 17:30 Uhr

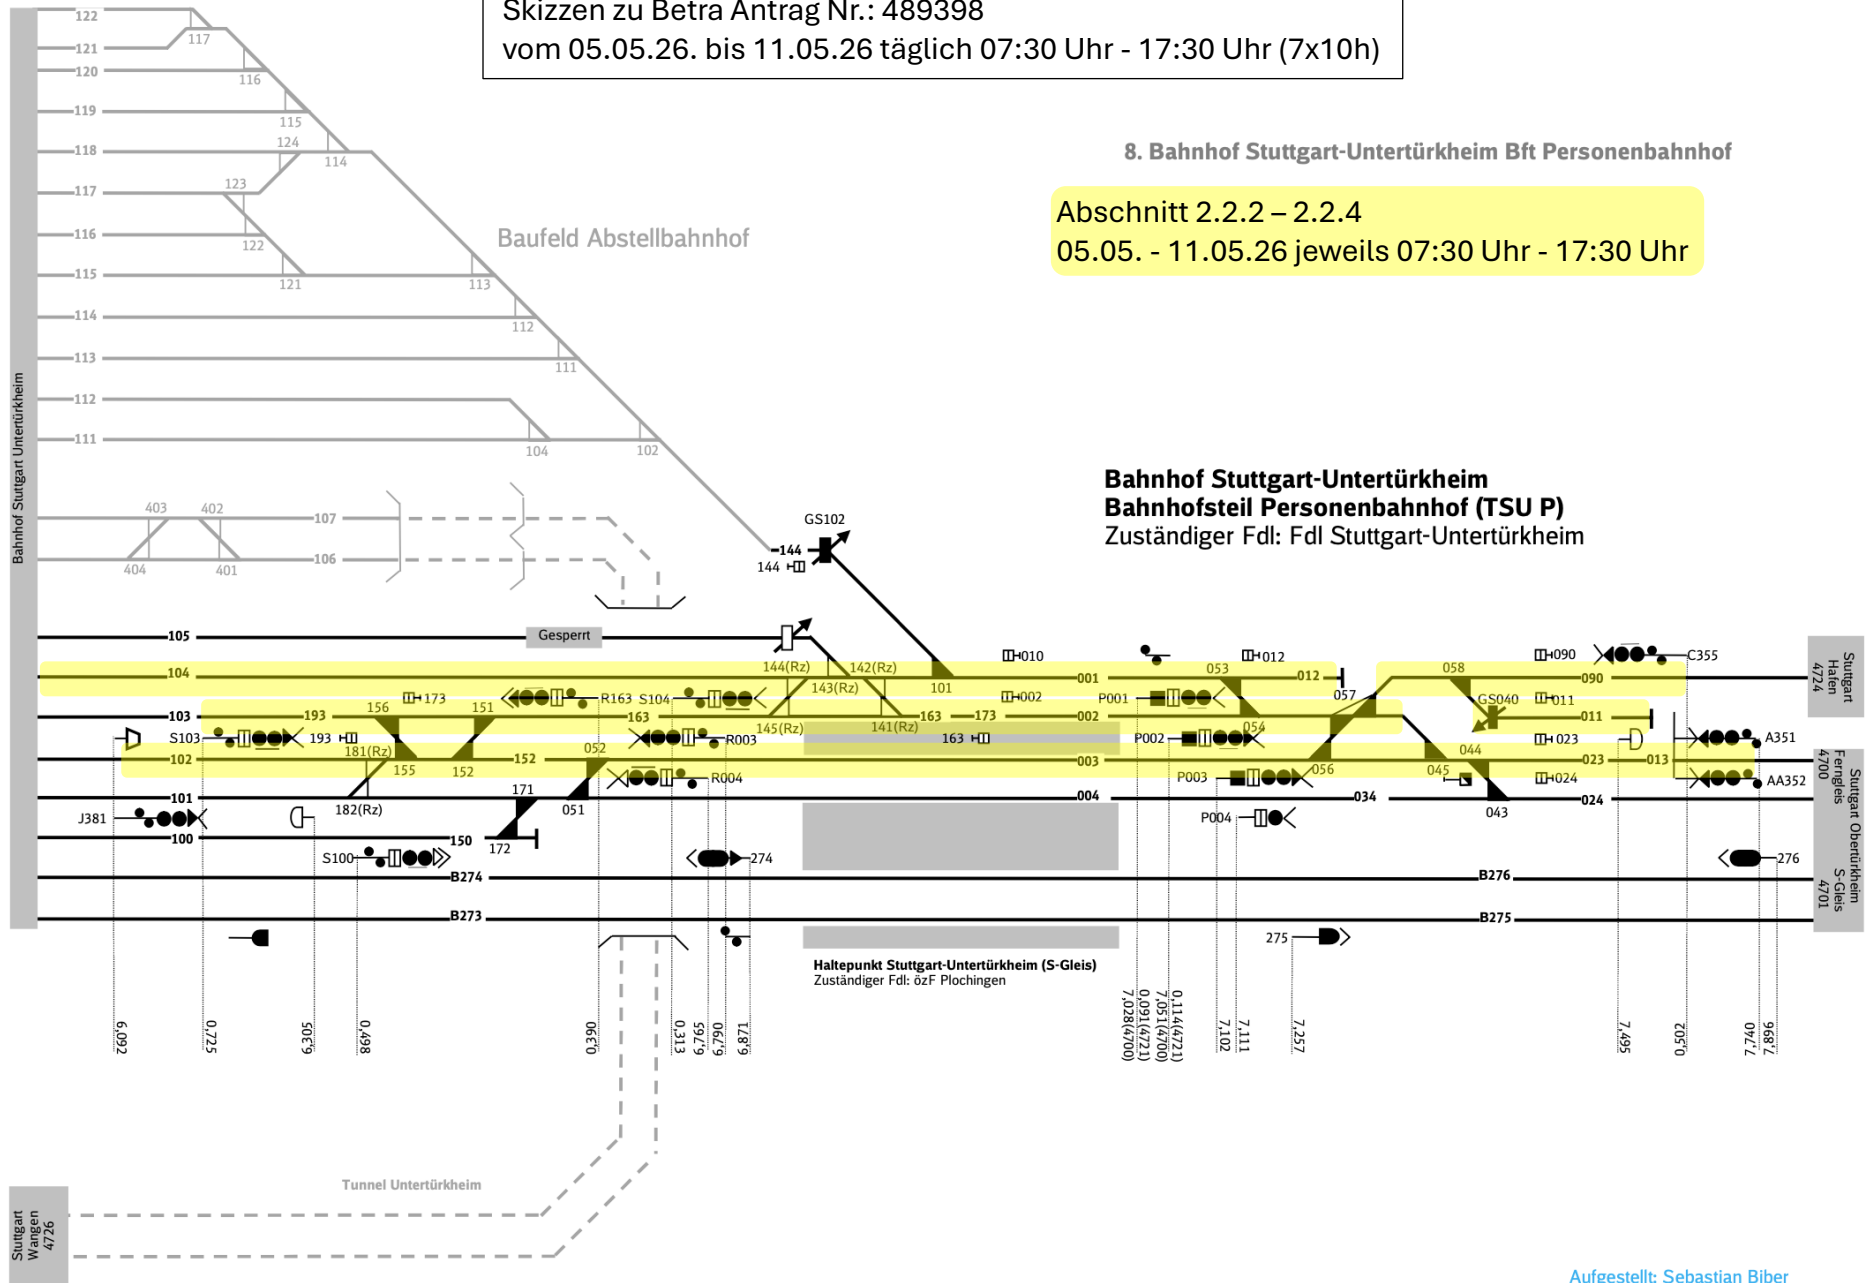

Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim
Bahnhofsteil Personenbahnhof (TSU P)
 Zuständiger FdI: FdI Stuttgart-Untertürkheim


Haltepunkt Stuttgart-Untertürkheim (S-Gleis)
 Zuständiger FdI: özF Plochingen

11. Strecke Stuttgart-Untertürkheim - Stuttgart Hafen

Skizzen zu Betra Antrag Nr.: 489398
vom 05.05.26. bis 11.05.26 täglich 07:30 Uhr - 17:30 Uhr (7x10h)

Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim
Bahnhofsteil Personenbahnhof (TSU P)
Zuständiger Fdl: Fdl Stuttgart Untertürkheim

Abschnitt 2.2.5 BGL TSH
05.05. - 11.05.26 jeweils 07:30 Uhr - 17:30 Uhr

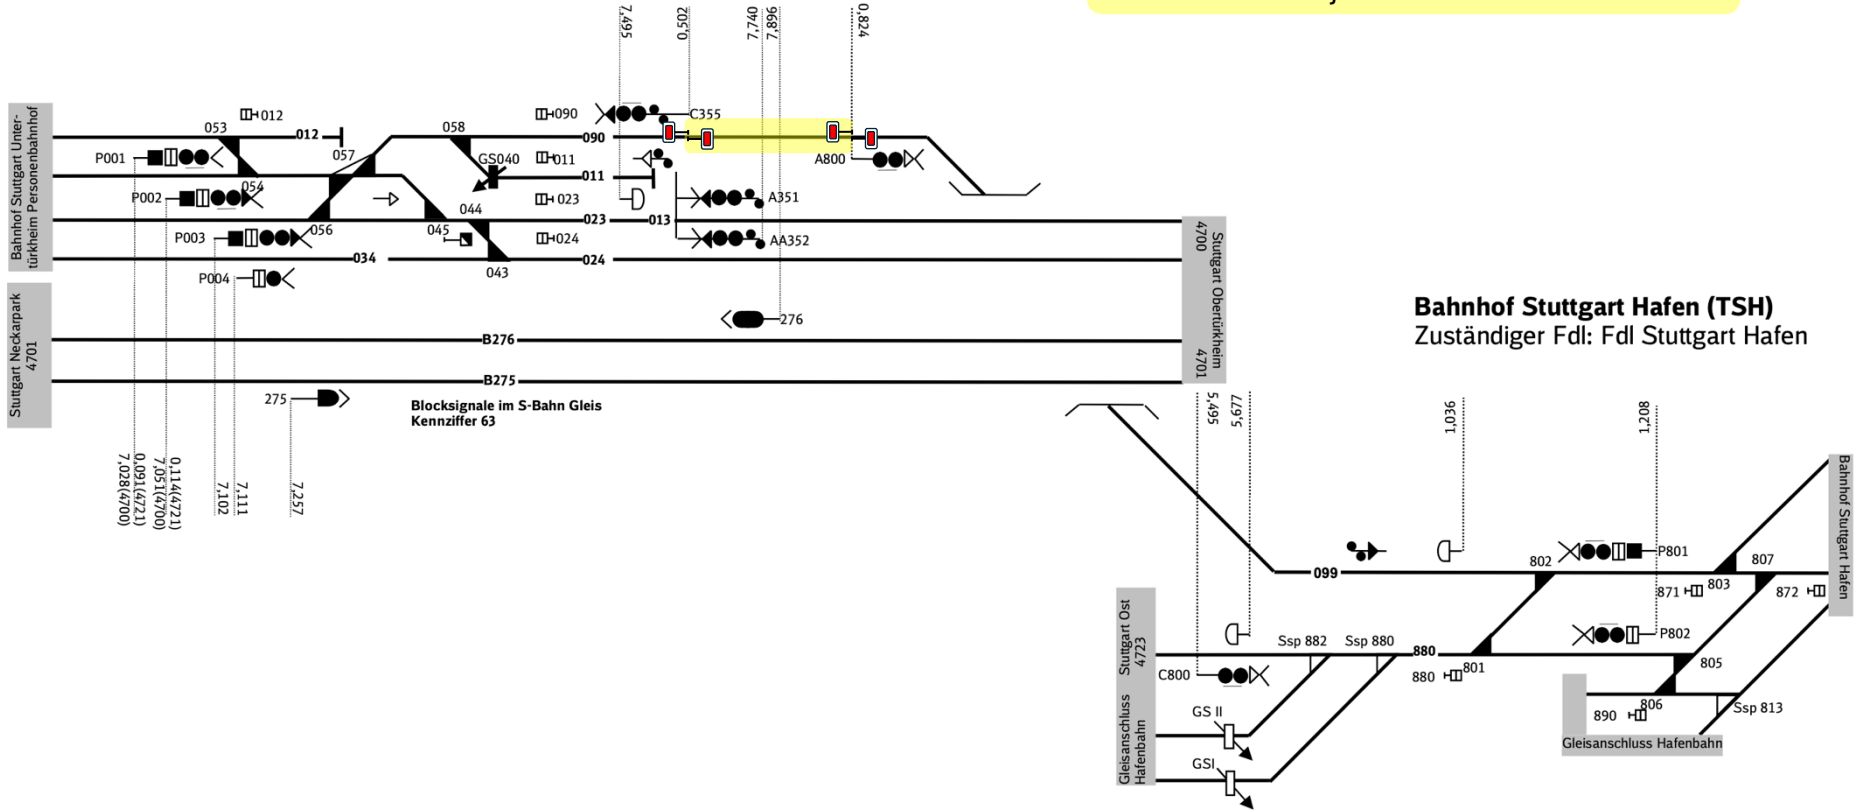

Bahnhof Stuttgart Hafen (TSH)
Zuständiger Fdl: Fdl Stuttgart Hafen

Aufgestellt: Sebastian Biber
Ausgabe 01/2026
